

Broj: 01-01.3-2598-60/18 AK
Datum: 17.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-2598-59/18 AK od 16.05.2019. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

I

Ugovor za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)“ u vrijednosti od **21.501.584,92 KM** sa uračunatim PDV-om i popustom u iznosu od 2%, dodjeljuje se ponuđaču: **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** sa registrovanim sjedištem u ulici Rajlovac bb, 71000 Sarajevo; IDB: 4200387990007, koji je u otvorenom postupku jedini podnio prihvatljivu ponudu.

II

Ponuda ponuđača **HERING d.d. Široki Brijeg**, se odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), iz razloga što ne ispunjavaju sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

IV

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

O b r a z l o ž e n j e

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 17. stav (1), 18. stav (1) i 19. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-2598-40/18 za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)“. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj 266-1-3-59-3-67/19 dana 15.02.2019. godine, te Ispravka za obavještenje o nabavci broj 266-1-3-59-8-108/19 dana 11.04.2019. godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 17.04.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića broj 19, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su svoje ponude blagovremeno predala ukupno 2 (dva) ponuđača.



P

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke ugovor za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)“ u vrijednosti od 21.501.584,92 KM sa uračunatim PDV-om i popustom u iznosu od 2%, dodjeljuje se ponuđaču: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem u ulici Rajlovac bb, 71000 Sarajevo; IDB: 4200387990007, koji je u otvorenom postupku jedini podnio prihvatljivu ponudu, dok se ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg, odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona. Detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg odbacuje kao neprihvatljiva dato je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 01-01.3-2598-59/18 AK od 16.05.2019. godine, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.


Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

**izvršni direktor
za projektovanje i građenje:**

.....


direktor:

.....

Adnan Terzić, dipl.ing.

Dostaviti:

- ponuđačima koji su predali ponude
- a/a



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

Broj: 01-01.3- 2598-59/18 AK
Datum: 16.05.2019. godine

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“ br. 103/14), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14 i 20/15) i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Komisija dostavlja:

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA u otvorenom postupku

- Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
- Predmet nabavke:** „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)“;
- Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-2598-40/18 AK;
- Vrsta postupka javne nabavke:** Otvoreni postupak;
- Procijenjena vrijednost nabavke:** 20.000.000,00 KM bez PDV-a;
- Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** Obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-59-3-67/19 objavljeno dana 15.02.2019. godine; Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-59-8-108/19 objavljeno dana 11.04.2019. godine;
- Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je počela da pregleda ponude 24.04.2019. godine;
- Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**
 - EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, zaprimljena dana 17.04.2019. godine u 10:35 sati, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 18.377.669,02 KM bez uračunatog PDV-a i sa ponuđenim popustom u iznosu od 2%, odnosno 21.501.872,75 KM sa uračunatim PDV-om i ponuđenim popustom u iznosu od 2%;
 - HERING d.d. Široki Brijeg, zaprimljena dana 17.04.2019. godine u 10:53 sati, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 18.242.531,42 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 21.343.761,76 KM sa uračunatim PDV-om;
- Podaci o pojašnjenju dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona ako ih je bilo:**
Nije traženo pojašnjenje dokumenata;
- Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke:** U ponudi ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg uočene su ispravke (str. 276, 345, 348, 365 i 376) urađene na način da su vidljive, potvrđene potpisom i pečatom ponuđača, te sa datumom izvršene ispravke;



11. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

RB	ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA	NAZIV PONUĐAČA	
	„Izgradnja Sarajevska obilaznica - LOT 3B“	Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo	Hering d.d. Široki Brijeg
a)	Kvalifikacioni uslovi:		
1.	<p>Lična sposobnost - kvalifikacija prema članu 45. ZJN:</p> <p>USLOV: U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:</p> <p>a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.</p> <p>DOKAZ: U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 tenderske dokumentacije</p>	+*	+*
2.	<p>Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti:</p> <p>USLOV:</p>		

	<p>Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.</p> <p>DOKAZ: U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.</p>	+	+
3.	<p><i>Ekonomsko i finansijska sposobnost</i></p> <p>Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, od ponuđača se zahtijeva ispunjenje slijedećih uslova ekonomske i finansijske sposobnosti:</p> <p>USLOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prosječan godišnji promet u posljednje 3 (tri) godine (2016, 2017, 2018) ne smije biti ispod 20.000.000,00 KM; b) pozitivno finansijsko poslovanje u posljednje 3 (tri) godine (2016, 2017, 2018); c) da računi ponuđača nisu bili blokirani duže od 7 (sedam) dana neprekidno te ne duže od 15 (petnaest) dana ukupno u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci od dana objave Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki (datum objave Obavještenja o nabavci je 15.02.2019. godine); <p>DOKAZ:</p> <p>Izjave ovjerene od strane ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije slijedećih dokumenata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izjava o prosječnom godišnjem prometu u posljednje 3 (tri) godine odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine. Izjava koja se prilaže ovjerava se kod nadležnog organa; b) kopija bilansa uspjeha za posljednje 3 (tri) finansijske godine (2016, 2017 i 2018), odnosno od početka poslovanja 	+	+

	<p>u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, ukoliko je objavljivanje bilansa uspjeha zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan. Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa uspjeha, ponuđač će dostaviti Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa;</p> <p>c) kopiju odgovarajuće potvrde Centralne banke BiH ili druge nadležne institucije u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan o transakcijskim računima ponuđača iz koje će biti vidljivo koje transakcijske račune ponuđač ima i odgovarajuće potvrde poslovnih banaka o stanju aktivnih transakcijskih računa ponuđača ili druga potvrda, u slučaju da takve potvrde izdaje neka druga institucija u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan, iz kojih će biti vidljivo da transakcijski računi ponuđača nisu bili blokirani duže od 7 (sedam) dana neprekidno te ne duže od 15 (petnaest) dana ukupno u prethodnih 12 (dvanaest) mjeseci od dana objave Obavještanja o nabavci na Portalu javnih nabavki (datum objave Obavještenja o nabavci je 15.02.2019. godine);</p> <p>Napomena:</p> <p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>***</p>	<p>+</p> <p>-</p> <p>***</p>
4.	<p>Tehnička i profesionalna sposobnost</p> <p>USLOV:</p> <p>a) da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora realizovanog u skladu sa FIDIC uslovima ugovora iz oblasti gradnje autocesta ili brzih cesta u vrijednosti od minimalno 20.000.000,00 KM u posljednjih 5 (pet) godina na izvođenju glavnih građevinskih radova koji su po strukturi slični radovima iz predmeta nabavke.</p> <p>DOKAZ:</p> <p>a) spisak uspješno izvršenih ugovora iz oblasti gradnje autocesta ili brzih cesta u posljednjih 5 (pet) godina, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan,</p>	<p>+</p>	<p>+</p>

	<p>odnosno počeo da radi prije manje od 5 (pet) godina. Iz spiska mora biti vidljivo da je ponuđač uspješno izvršio najmanje 1 (jedan) ugovor u skladu sa FIDIC uslovima ugovora iz oblasti gradnje autocesta ili brzih cesta u vrijednosti od minimalno 20.000.000,00 KM u posljednjih 5 (pet) godina na izvođenju glavnih građevinskih radova koji su po strukturi slični radovima iz predmeta nabavke. Forma Spiska izvršenih ugovora data je u Aneksu 10 tenderske dokumentacije.</p> <p>Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu o uspješnom iskustvu u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora realizovanog u skladu sa FIDIC uslovima ugovora iz oblasti gradnje autocesta ili brzih cesta, u vrijednosti od minimalno 20.000.000 KM na izvođenju glavnih građevinskih radova koji su po strukturi slični radovima iz predmeta nabavke, koju su izdali krajnji korisnici. Potvrda obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbjedi;</p>	+	+
5.	<p>USLOV:</p> <p>b) da ponuđač ima na raspolaganju za realizaciju ugovora slijedeću opremu i mehanizaciju:</p> <p>Bager (ne stariji od 7 godina).....3 kom</p> <p>Bager sa hidrauličkim čekićem (ne stariji od 7 godina).....1 kom</p> <p>Buldožer (ne stariji od 7 godina).....2 kom</p> <p>Utovarivač (ne stariji od 7 godina).....2 kom</p> <p>Tandem valjak sa statičkim i dinamičkim dejstvom (8 – 12 t, ne stariji od 7 godina)2 kom</p> <p>Kamion (nosivost > 18 t, ne stariji od 7 godina).....6 kom</p> <p>Kamion (nosivost > 18 t, opremljen za transport asfaltne mješavine ne stariji od 7 godina)6 kom</p> <p>Postrojenje za proizvodnju betona (kapacitet proizvodnje ≥ 60 m³/h, na rastojanju ne većem od 20 km od gradilišta, ne starije od 10 godina)1 kom</p> <p>Betonska pumpa (kapacitet distribucije ≥ 40 m³/h,</p>		

ne starija od 7 godina).....2 kom		
Auto mikser za prevoz betonske mješavine (ne stariji od 7 godina).....4 kom		
Postrojenje za proizvodnju asfaltne mješavine (kapacitet proizvodnje ≥ 100 t/h, na rastojanju ne većem od 50 km od gradilišta, ne starije od 10 godina)1 kom		
Finišer gusjeničar za ugradnju asfaltne mješavine (min. širina ugradnje: 8 m; min. kapacitet distribucije 500 t/h, ne stariji od 7 godina).....1 kom		
Set mehanizacije za ugradnju asfalta (prskalice za bitumensku emulziju, cisterna za vodu, set tandem valjaka 4, 8, 10, 12 t, valjak sa gumenim točkovima 16t, ne stariji od 7 godina)1 set		
Grejder (≥ 120 kW, ne stariji od 7 godina)1 kom		
Toranjaska dizalica – kran (ne stariji od 7 godina).....2 kom		
Laboratorijska oprema (geomehanika, beton, asfalt).....1 set		
DOKAZ:		
b) Izjava ovjerena od strane ponuđača da ponuđač ispunjava uslove tehničke i profesionalne sposobnosti navedene u tački 7.4.1. b) ove tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 8 tenderske dokumentacije.	+	+
Uz Izjavu se kao prilog dostavlja tabelarni pregled zahtjevanе opreme i mehanizacije (Spisak opreme i mehanizacije) sa ispunjenim traženim podacima.	+	+
Izabrani ponuđač će, pored navedene opreme i mehanizacije, ukoliko se ukaže potreba obezbjediti i drugu opremu i mehanizaciju neophodnu za uspješnu realizaciju ugovora.		
Bager (ne stariji od 7 godina).....3 kom	+	+
Bager sa hidrauličkim čekićem (ne stariji od 7 godina).....1 kom	+	+
Buldožer (ne stariji od 7 godina).....2 kom	+	+
Utovarivač (ne stariji od 7 godina).....2 kom	+	+
Tandem valjak sa statičkim i dinamičkim dejstvom (8 – 12 t, ne stariji od 7 godina)2 kom	+	+

	Kamion (nosivost > 18 t, ne stariji od 7 godina).....6 kom	+	+
	Kamion (nosivost > 18 t, opremljen za transport asfaltne mješavine ne stariji od 7 godina)6 kom	+	+
	Postrojenje za proizvodnju betona (kapacitet proizvodnje ≥ 60 m ³ /h, na rastojanju ne većem od 20 km od gradilišta, ne starije od 10 godina)1 kom	+	+
	Betonska pumpa (kapacitet distribucije ≥ 40 m ³ /h, ne starija od 7 godina).....2 kom	+	+
	Auto mikser za prevoz betonske mješavine (ne stariji od 7 godina).....4 kom	+	+
	Postrojenje za proizvodnju asfaltne mješavine (kapacitet proizvodnje ≥ 100 t/h, na rastojanju ne većem od 50 km od gradilišta, ne starije od 10 godina)1 kom	+	+
	Finišer gusjeničar za ugradnju asfaltne mješavine (min. širina ugradnje: 8 m; min. kapacitet distribucije 500 t/h, ne stariji od 7 godina).....1 kom	+	+
	Set mehanizacije za ugradnju asfalta (prskalica za bitumensku emulziju, cisterna za vodu, set tandem valjaka 4, 8, 10, 12 t, valjak sa gumenim točkovima 16t, ne stariji od 7 godina)1 set	+	+
	Grejder (≥ 120 kW, ne stariji od 7 godina)1 kom	+	+
	Toranjaska dizalica – kran (ne stariji od 7 godina).....2 kom	+	+
	Laboratorijska oprema (geomehanika, beton, asfalt).....1 set	+	+
6.	<p>USLOV:</p> <p>c) da ponuđač ima na raspolaganju slijedeće ključno osoblje za realizaciju ugovora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozicija Voditelj Projekta (sa kvalifikacijama, opštim i specifičnim iskustvom datim u tabeli na str. 7. i 8. Tenderske dokumentacije) • Pozicija Voditelj radova na konstrukcijama (sa kvalifikacijama, opštim i specifičnim iskustvom datim u tabeli na str. 8. Tenderske dokumentacije) • Pozicija Voditelj zemljanih radova (sa kvalifikacijama, opštim i specifičnim iskustvom datim u tabeli na str. 8. i 9. Tenderske dokumentacije) <p>DOKAZ:</p> <p>c) Izjava ovjerena od strane ponuđača da</p>	+	+

	<p>ponuđač ispunjava uslove tehničke i profesionalne sposobnosti navedene u tački 7.4.1. c) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 8.1 tenderske dokumentacije.</p> <p>Uz Izjavu se kao prilog dostavljaju sljedeći dokumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabelarni pregled zahtjevanog ključnog osoblja (Spisak ključnog osoblja) sa ispunjenim traženim podacima i - svojeručno potpisani CV-jevi za ključno osoblje iz kojih je jasno vidljivo da svaki predloženi stručnjak posjeduje traženo iskustvo. <ul style="list-style-type: none"> • Pozicija Voditelj Projekta (sa kvalifikacijama, općim i specifičnim iskustvom datim u tabeli na str. 7. i 8. Tenderske dokumentacije) • Pozicija Voditelj radova na konstrukcijama (sa kvalifikacijama, općim i specifičnim iskustvom datim u tabeli na str. 8. Tenderske dokumentacije) • Pozicija Voditelj zemljanih radova (sa kvalifikacijama, općim i specifičnim iskustvom datim u tabeli na str. 8. i 9. Tenderske dokumentacije) 		
		+	_***
		+	+
		+	+
		+	+
		+	+
b)	Ispunjenost uvjeta u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadržaju ponude		
1.	Popunjen obrazac za ponudu koji je dat u aneksu 2 tenderske dokumentacije	+	+
2.	Popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u aneksu 3 tenderske dokumentacije	+	+
3.	Popunjen obrazac povjerljivih informacija koji je dat u aneksu 4 tenderske dokumentacije (ponuđači su dužni dostaviti ispunjen ovaj obraz ukoliko imaju povjerljivih informacija)	+	+
4.	Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona koja je data u Aneksu 5 tenderske dokumentacije	+*	+*
5.	Potpisan Nacrt ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 6	+	+
6.	Izjava o ispunjavanju uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti koja je data u Aneksu 7 tenderske dokumentacije	+	+
7.	Izjava o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne sposobnosti iz tačke 7.4.1.b) tenderske dokumentacije – u formi datoju u Aneksu 8 i prateća dokumentacija uz Izjavu (Spisak opreme i mehanizacije)	+	+
8.	Izjava o sukobu interesa člana 52. Zakona koja je data u Aneksu 9 i Aneksu 9.1 tenderske dokumentacije;	+	+
9.	Izjava ponuđača o obezbjeđivanju „Ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja“ za	+****	+****

	građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju - Sl. Novine Federacije BiH br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15) u formi datoj u Aneksu 11 tenderske dokumentacije;		
10.	Bankovna garancija za ozbiljnost ponude u skladu sa obrascem iz Aneksa 12 tenderske dokumentacije;	+	+
11.	Parafiran i popunjen Predmjer radova dat u Aneksu 14 tenderske dokumentacije;	+	+
12.	Izjava o namjeri podugovaranja (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovoriti dio ugovora) data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije	Nema namjeru podugovarati	Nema namjeru podugovarati
13.	Ponuđač ispunjava uslov za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg data u okviru aneksa 2 tenderske dokumentacije	da	da
14.	Izjava o zajedničkoj ponudi te Izjava o solidarnoj odgovornosti članova grupe ponuđača (ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača)	n.p.	n.p.
15.	Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu	+	+
c)	Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku sadržaju i potpunosti		
1.	Cjelovitost ponude	+	+
2.	Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jemstvenikom/	+	+
3.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	+	+
4.	Pravilno numerisana ponuda	+	+
5.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	+	+
6.	Ispravke u ponudi	n.p.	-
7.	Računske greške	da	da
8.	Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude	n.p.	n.p.
9.	Ponuda potpisana od strane ovlaštene osobe	+	+
10.	Dostavljena kopija ponude	+	+
	PRIHVATLJIVOST PONUDE DA/NE	DA	NE

Napomena:

(+) u skladu sa tenderskom dokumentacijom **zadovoljava**;

(+*) ponuđač je uz Izjavu o ispunjenosti uslova lične sposobnosti u skladu sa članom 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona u ponudi dostavio ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ispunjenost postavljenih uslova u pogledu lične sposobnosti ponuđača;

(+)** ponuđač je u ponudi dostavio ovjerene kopije dokumenata u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti (bilansi uspjeha za 3 (tri) finansijske godine (2016, 2017 i 2018), potvrda Centralne banke BiH, te potvrde poslovnih banaka o stanju aktivnih računa);

(-*)** ponuđač je u sklopu ponude dostavio tabelarni pregled zahtjevanog ključnog osoblja, međutim iz istog nije vidljivo da predloženi stručnjak Mario Jurišić, pozicija Voditelj Projekta

posjeduje traženo specifično iskustvo (najmanje 7 godina na sličnoj poziciji pri izgradnji cesta i autocesta) te da predloženi stručnjak Zlatko Čerkez, pozicija Voditelj zemljanih radova posjeduje traženo specifično iskustvo (najmanje 5 godina na sličnoj poziciji pri izgradnji cesta i autocesta);

(+****) ponuđač je u ponudi dostavio ovjerenu kopiju važećeg „Ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja“ za obavljanje djelatnosti građenja građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH;

(-) u skladu sa tenderskom dokumentacijom **ne zadovoljava**;

(n.p) nije primjenjivo;

12. Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja za svakog ponuđača posebno:

1. Ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg ne ispunjava uslove ekonomske i finansijske sposobnosti iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama (tačka 7.3.1 c) tenderske dokumentacije) iz sljedećeg razloga:

Naime, tačkom 7.3.1. c) tenderske dokumentacije (ekonomska i finansijska sposobnost) propisan je sljedeći uslov:

c) da računi ponuđača nisu bili blokirani duže od 7 (sedam) dana neprekidno te ne duže od 15 (petnaest) dana ukupno u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci od dana objave Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki (datum objave Obavještenja o nabavci je 15.02.2019. godine);

Tačkom 7.3.2. c) propisano je da će se ocjena ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača izvršiti na osnovu dostavljene kopije odgovarajuće potvrde Centralne banke BiH ili druge nadležne institucije u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan o transakcijskim računima ponuđača iz koje će biti vidljivo koje transakcijske račune ponuđač ima i odgovarajuće potvrde poslovnih banaka o stanju aktivnih transakcijskih računa ponuđača ili druga potvrda, u slučaju da takve potvrde izdaje neka druga institucija u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan, iz kojih će biti vidljivo da transakcijski računi ponuđača nisu bili blokirani duže od 7 (sedam) dana neprekidno te ne duže od 15 (petnaest) dana ukupno u prethodnih 12 (dvanaest) mjeseci od dana objave Obavještanja o nabavci na Portalu javnih nabavki (datum objave Obavještanja o nabavci je 15.02.2019. godine).

Naprijed pomenuti ponuđač je u ponudi dostavio ovjerenu kopiju potvrde Centralne banke BiH te ovjerene kopije poslovnih banaka o stanju računa ponuđača.

Pored ostalih potvrda poslovnih banaka, kod kojih ponuđač ima aktivne račune, a koje su uredne, ponuđač je dostavio potvrdu izdatu od strane Addiko Bank d.d. Sarajevo, dana 21.03.2019. godine, u kojoj je navedeno da klijent Hering d.d. Široki Brijeg, u navedenoj banci ima otvoren transakcijski račun broj 3060280000030705 i devizni račun broj BA393060203700114818, te da isti nisu bili blokirani u posljednjih 5 (pet) mjeseci.

Iz Izvještaja o računima poslovnog subjekta izdatog od strane Centralne banke BiH je vidljivo da je devizni račun BA393060203700114818 aktivan od 01.10.2018. godine, a prema potvrdi banke koja je izdata 21.03.2019. godine, navedeni račun nije bio blokirani u posljednjih 5 (pet) mjeseci od dana izdavanja potvrde, iz čega jasno proizilazi da period koji potvrdom nije pokriven je od 01.10.2018. godine do 21.10.2018. godine.

Nadalje, za transakcijski račun broj 3060280000030705 iz Izvještaja o računima poslovnog subjekta izdatog od strane Centralne banke BiH je vidljivo da je isti aktivan od 18.03.2003. godine, a prema potvrdi banke koja je izdata 21.03.2019. godine navedeni račun nije bio blokirani u posljednjih pet (5) mjeseci od dana izdavanja potvrde, iz čega jasno proizilazi da to nije period zahtjevan tenderskom dokumentacijom, te da period koji potvrdom nije pokriven je od 15.02.2018. godine do 21.10.2018. godine.

Shodno svemu naprijed navedenom, ponuđač HERING d.d. Široki Brijeg dostavljenim potvrdama nije dokazao da ispunjava zahtjevani uslov ekonomske i finansijske sposobnosti propisan tačkom 7.3.1 c) predmetne tenderske dokumentacije.

Nadalje, ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg ne ispunjava u potpunosti uslove tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona (tačka 7.4.1. c) tenderske dokumentacije i to iz sljedećeg razloga:

Ponuđač je kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 7.4.1 c) tenderske dokumentacije dužan dostaviti:

c) Izjavu ovjerenu od strane ponuđača da ponuđač ispunjava uslove tehničke i profesionalne sposobnosti navedene u tački 7.4.1. c) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 8.1 tenderske dokumentacije.

Uz Izjavu se kao prilog dostavljaju sljedeći dokumenti:

- tabelarni pregled zahtjevanog ključnog osoblja (Spisak ključnog osoblja) sa ispunjenim traženim podacima i
- svojeručno potpisani CV-jevi za ključno osoblje iz kojih je jasno vidljivo da svaki predloženi stručnjak posjeduje traženo iskustvo.

Ponuđač HERING d.d. Široki Brijeg je kao prilog Izjave o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne sposobnosti dostavio tabelarni pregled zahtjevanog ključnog osoblja (Spisak ključnog osoblja), međutim iz istog nije vidljivo da predloženi stručnjak Mario Jurišić na poziciji Voditelja Projekta, posjeduje traženo specifično iskustvo (najmanje 7 godina iskustva na sličnoj poziciji pri izgradnji cesta ili autocesta). Naime, iako je iz dostavljenog CV-ja za navedenog stručnjaka vidljivo relevantno radno iskustvo, u spisku su navedene slične pozicije/projekti kojima dokazuje specifično iskustvo u trajanju od ukupno četiri (4) godine.

Nadalje, iz dostavljenog spiska ključnog osoblja, nije vidljivo da predloženi stručnjak Zlatko Čerkez, na poziciji Voditelja zemljanih radova, posjeduje traženo specifično iskustvo (najmanje 5 godina na sličnoj poziciji pri izgradnji cesta i autocesta). Naime, iako je iz dostavljenog CV-ja za navedenog stručnjaka vidljivo relevantno radno iskustvo, u spisku su navedene slične pozicije/projekti kojima dokazuje specifično iskustvo u trajanju od ukupno četiri (4) godine.

Shodno tome, Spisak ključnog osoblja nije dostavljen u skladu sa tačkom 7.4.2. c) tenderske dokumentacije, kojom je propisano da isti bude dostavljen sa ispunjenim svim traženim podacima, te kao takav nije prihvatljiv za ugovorni organ.

Pored navedenog, ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg ne ispunjava sve zahtjeve tenderske dokumentacije iz sljedećeg razloga:

Na stranici 274 ponude, Aneks 14 – Predmjer radova, uočena je ispravka koja nije izvršena na način propisan tačkom 8.1.4. tenderske dokumentacije koji glasi: „*Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke (ispravke se ne vrše korektorom - mora biti vidljivo prvobitno upisano stanje prije ispravke, koje se precrtava i pored njega se upisuje ispravljeno. Ispravke moraju uz navod datuma biti potvrđene pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe).*“

Shodno svemu navedenom Komisija za nabavke će dati prijedlog Ugovornom organu da ponudu ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg odbije kao neprihvatljivu u skladu s članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Napomena:

Ponuđač je u ponudi dostavio i dokumente koje nije bio obavezan dostavljati uz ponudu, a isti su propisani u tački 7.4.4. a) i b) tenderske dokumentacije. Navedene dokumente je bio dužan dostaviti izabrani ponuđač u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti za koje je dostavio Izjave (Aneks 8 i Aneks 8.1). Komisija za nabavku izvršila je pregled i ocjenu istih te konstatovala sljedeće:

Za traženu opremu i mehanizaciju: Ponuđač je dostavio popunjene obrasce u skladu sa Aneksom 15 za raspoloživost opreme, za svaku stavku opreme pojedinačno, te originalne ugovore o najmu, obzirom da ista nije u vlasništvu ponuđača, za svu ponuđenu opremu.

Za ključno osoblje: Ponuđač je dostavio ovjerene kopije diploma i ovjerene kopije uvjerenja o položenom ispitu, za svo predloženo stručno osoblje, te ovjerenu kopiju liste osiguranih lica ponuđača izdatu od strane nadležne institucije, za predloženo stručno osoblje koji su zaposlenici ponuđača, te original ugovora o poslovnoj saradnji za predloženog stručnjaka koji nije zaposlenik ponuđača.

13. **Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude:** Ugovorni organ je zahtjevao bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 200.000,00 KM (slovima: dvijestotinehiljada i 00/100) sa rokom važenja 28 dana duže od propisanog roka važenja ponude, odnosno ukupno 148 (stotinučetredesetosam) dana. Svi ponuđači su dostavili zahtjevanu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u traženoj vrijednosti, te sa propisanim rokom važenja;
14. **Podaci o pojašnjenju ponuda:** Nije traženo pojašnjenje ponuda;
15. **Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti iz zapisnika sa otvaranja ponuda:** Zaprimljene ponude uredno zapakovane cijena, bez PDV-a upoređena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3, identična u oba obrasca;
16. **Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača:** Pogledati tačku 11. ovog Zapisnika;
17. **Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke** Zaprimljene ponude ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke.
18. **Podaci o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo:** Prilikom računске kontrole u ponudama oba ponuđača su uočene računске greške. Uzimajući u obzir da je ponuda ponuđača Hering d.d. Široki Brijeg neprihvatljiva, od istog nije tražena saglasnost za ispravku računskih grešaka u ponudi, dok je ponuđaču Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo upućen Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi. Ponuđač Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo je blagovremeno dostavio traženu saglasnost za ispravku računskih grešaka, koja se nalazi u prilogu ovog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te čini njegov sastavni dio.
19. **Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:** Pogledati tačku 12. ovog Zapisnika;
20. **Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene:** Nije primjenjivo;
21. **Analiza prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:** U skladu sa članom 64. Zakona, te tačkom 9.1.1. tenderske dokumentacije, kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“. Ponuđač Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo je u predmetnom postupku jedini dostavio prihvatljivu ponudu;

22. Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Redni broj	Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a (KM)	Popust (%)	PDV (17%) (KM)	Ukupna cijena sa PDV-om i popustom (KM)
1.	Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo	18.752.472,46	2	3.124.161,91	21.501.584,92

23. Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor: Nije primjenjivo;

24. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podatke o podizvođaču: Nije primjenjivo;

25. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci: Ponuđač Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo je u ponudi dostavio ovjerene kopije svih zahtjevanih dokumenata kojima dokazuje ispunjavanje uslova lične sposobnosti iz člana 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona, zatim ovjerene kopije svih zahtjevanih dokumenata kojima dokazuje ispunjavanje uslova ekonomske i finansijske sposobnosti iz člana 47. Zakona, kao i ovjerenu kopiju važećeg „Ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja“ za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova izdato na osnovu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene Novine FBiH“, br.: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), te iste **nije dužan ponovo dostavljati** nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nadalje, ponuđač Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo je u ponudi dostavio dokumentaciju koju je dužan dostaviti izabrani ponuđač u svrhu dokazivanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa tačkom 7.4.4. tenderske dokumentacije, te istu **nije dužan ponovo dostavljati** nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Za traženu opremu i mehanizaciju: Ponuđač je dostavio popunjene obrasce u skladu sa Aneksom 15 za raspoloživost opreme, za svaku stavku opreme pojedinačno, te ovjerene kopije upotrebni dozvola, potvrde o registraciji, potvrde o vlasništvu, račun/otpremnice za opremu i mehanizaciju koja je u vlasništvu ponuđača, te ovjerene kopije ugovora u najmu opreme, ugovora o kupoprodaji, ugovora o poslovno tehničkoj saradnji za opremu i mehanizaciju koja nije u vlasništvu ponuđača, kao i certifikata o akreditaciji za usluge vršenja laboratorijskog ispitivanja građevinskih materijala.

Za ključno osoblje: Ponuđač je dostavio ovjerene kopije diploma, ovjerene kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu, te ovjerenu kopiju liste osiguranih lica ponuđača izdatu od strane nadležne institucije, uzimajući u obzir činjenicu da su svi predloženi stručnjaci zaposlenici ponuđača.

26. Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem: Komisija za nabavke daje prijedlog direktoru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom se Ugovor za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)“ u ukupnoj vrijednosti od 21.501.584,92 KM sa uračunatim PDV-om i popustom u iznosu od 2%, dodjeljuje ponuđaču Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, koji je u predmetnom postupku jedini dostavio ponudu koja je prihvatljiva, odnosno ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a da se ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg odbaci kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona, iz razloga što ne ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom;

P.

27. **Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 16.05.2019. godine;
28. **Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):**
- Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi, akt ugovornog organa broj: 01-01.3-2598-57/18 AK od 13.05.2019. godine
 - Saglasnost za ispravku računске greške, broj: EA-IS-44/19, zaprimljena kod ugovornog organa dana 15.05.2019. godine;
29. **Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:**

Članovi komisije:

Amra Kahrimanović, predsjednik komisije.....
 Melika Alajbegović, član komisije
 Nerim Hasić, član komisije
 Samir Pirić, član komisije
 Vedad Terzić, član komisije

Saglasan direktor:

.....
 Adnan Terzić, dipl.ing.

Broj: 01-01.3-2598-57/18 AK
Datum: 13.05.2019.godine

Za: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
Rajlovac bb
71000 Sarajevo
Fax: +387 33 590 746
e-mail: info@euro-asfalt.ba

PREDMET: Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi

Poštovani,

Prilikom provjere računске ispravnosti vaše ponude, broj: EA-04/19 od 16.04.2019. godine za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3b)“ uočili smo brojne računске greške u Predmjeru radova, te konsekvntno i u Obrascu za cijenu ponude i Obrascu za ponudu.

Shodno članu 17. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br.: 90/14 i 20/15), izvršili smo ispravku računskih grešaka, te vam u prilogu dostavljamo kopije stranica ponude sa izvršenim ispravkama cijene.

Molimo da i sami izvršite računsku provjeru ispravljenih iznosa, te da u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda date saglasnost na izvršene ispravke, odnosno saglasnost da ukupna cijena vaše ponude iznosi **18.377.423,01 KM** bez uključenog PDV-a, odnosno **21.501.584,92 KM** sa uključenim PDV-om (slovima: dvadesetjedanmilijonpetstotinajednahiljadapetstotinaosamdesetčetiri i 92/100 KM).

Traženu saglasnost potrebno je dostaviti najkasnije do 16.05.2019. godine do 15:00 sati na faks broj +387 33 277 942.

Direktor
Adnan Terzić, dipl.ing.

Prilog: - kao u tekstu.



P

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli i za koji je Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-59-3-67/19 dana 15.02.2019. godine, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo slijedeće:

- U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije 01-01.3-2598-40/18 AK ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
- Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
- Cijena** naše ponude (bez PDV-a i popusta) je: 18.752.923,49 KM 18.752.472,46
 Popust koji dajemo na cijenu ponude u iznosu od 20 % tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi 18.377.669,02 KM. 18.377.423,01
 PDV (17%): 3.124.203,73 KM. 3.124.161,91
Ukupna cijena sa PDV-om iznosi: 21.501.872,75 KM. 21.501.584,92
 slovima: dvadeset jedan milion petsto tina i sedamsto i sedamdeset i 100 KM.

- Podugovaranje (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja): petsto i osamsto i četrina 92/100

Naziv i sjedište podugovarača (opciono): _____

(tačan naziv i adresa sjedišta podugovarača)

i obavezno popuniti ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja:

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati: _____

(predmet podugovora, količina i mjesto izvođenja radova)

_____ u iznosu od _____ % vrijednosti ugovora.

(vrijednost podugovorenih radova)

Plaćanje podugovaraču će vršiti: _____

(navesti način plaćanja Podugovarača (direktno ili indirektno))

Napomena: Ponuđač mora navesti naprijed navedene podatke, ukoliko ima namjeru dio ugovora podugovarati, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja. Ukoliko, ponuđač ne popuni gore navedena polja smatrat će se da ponuđač nema namjeru podugovaranja, a ponuda neće biti odbačena kao neprihvatljiva.

- U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):

- Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,
- Naša ponuda NE ISPUNJAVA uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na našu ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.
- Grupa ponuđača koja dostavlja ovu ponudu je sastavljena od članova kojima je sjedište u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i najmanje jednog člana sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ovog ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg




OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

strana 1 od 2

Naziv Ponuđača: EURO-ASFALT d.o.o. SARAJEVOPonuda broj: EA-04/19Datum: 16.04.2019.

REKAPITULACIJA (KM)		
Sarajevska obilaznica LOT 3B		
Dionica: Vlakovo - Mostarsko Raskršće		
A	TRASA	5.517.455,21
B	PUTEVI VAN TRASE	505.038,07
	505.068,58	
D	ODVODNJA	869.470,41
E	SIGNALIZACIJA I OPREMA	479.328,30
F	OBJEKTI	4748.923,28
	4.748.964,16	
G	INSTALACIJE - RASVJETA	335.970,40
G	INSTALACIJE - IZMJEŠTANJE	595.718,35
	595.418,35	
H	ZAŠTITA OD BUKE	3.791.026,43
K	OSTALI RADOVI	205.000,00
I	UKUPNO Σ (A;K)	17.047.930,44
	17.047.702,23	
II	NEPREDVIĐENI RADOVI	
	0,10 x I	1.704.793,04
	1.704.770,22	
III	CIJENA PONUDE bez PDV i	
	POPUSTA (I +II)	18.752.723,49
	18.752.472,46	
IV	POPUST na stavku III2,00..... [%]	375.054,47
		375.049,45
V	UKUPNO SA POPUSTOM bez PDV	
	Σ (III - IV)	18.377.669,02
		18.377.423,01



Nr.	Item/ Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
-----	--------------	------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------------

B.7. ROADS OUT OF ALIGNMENT / SAOBRAĆAJNICE VAN TRASE



B.7.4. LOCAL ROAD at km 1+121,08/ LOKALNI PUT na km 1+121,08

2. PREPARATION WORKS / PRIPREMNI RADOVI



58	2.4	Removing of trees and bushes/ Odstranjivanje grmlja i drveća	km	0,21	8.572,50	1.800,23
59	2.7	Demolition of SOLID material single storey buildings with transport to the disposal area. / Rušenje prizemnih zgrada čvrstog materijala uključujući utovar i transport na deponiju	m2	43,52	47,63	2.072,64 2.072,86
58-59		TOTAL PREPARATION WORKS PRIPREMNI RADOVI:	UKUPNO			3.872,87 3.873,08

3. ROAD BED / DONJI STROJ


60	3.1	Bulk excavations of topsoil, included loading and hauling to the disposal area. / Široki otkopi i prevozi humusa sa odvozom viška materijala na deponiju	m3	565,35	10,18	5.757,24 5.755,26
	3.2	Bulk excavations on route./ Otkopavanje zemlje u širokom otkopu na trasi.				
61		a) In material of III and IV category, including loading and transport to disposal area. / U materijalu III i IV klg. sa utovarom i prevozom na deponiju.	m3	3.247,64	14,00	45.472,64 45.466,36
	3.2	Bulk excavation and delivery of V and VI category material from quarry. Transport to the site is included in price. Material suitable for work in winter and rainy conditions. The Investor is not in charge for quarry. / Široki otkop i doprema materijala V i VI kategorije iz kamenoloma (pozajmišta). Cijena uključuje i prevoz na trasu. Materijal pogodan za rad u kišnim i zimskim uslovima. Kamenolom nije obaveza investitora				
62		a) For embankment of road bed, item 3.4./ Za nasip trupa puta, stavka 3.4. d=0-300mm	m3	1.410,87	23,81	33.596,34 33.592,81
63	3.3	Compaction of subsoil Nabijanje podtla	m2	2.409,97	0,48	1.150,76 1.156,73
	3.4	Embankment formation Izrada nasipa				




Nr	Item/ Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
54		a) Embankment from stone material V and VI category. Grading up to 300mm. Material from item 3.2. subitem "a". Material suitable for work in rainy and winter conditions. / Izrada nasipa od kamenog materijala V i VI kategorije. Maksimalno zrno agregata do 300 mm. Materijal iz stavke 3.2. podstavka "a". Materijal pogodan za rad u kišnim i zimskim uslovima.	m3	1.410,87	6,97	9.833,76
65	3.4.4.6	Stepped excavation including loading and hauling to disposal area in material of III or IV category. / Iskop stepenica sa odvozom materijala na deponiju u materijalu III i IV kategorije.	m3	110,51	15,99	1.767,05
		3.7 DRAINAGE OF ROAD BED DRENIRANJE I ODVODNJAVANJE TRUPA PUTA				
	3.7.3.1	Excavation of trench and channel for drainage including hauling to disposal area. / Iskop rovova i kanala za drenaže sa transportom iskopanog materijala na deponiju.				
66		a) Depth 0-2 m in material of III & IV category / Dubina 0-2m u materijalu III i IV kategorije	m3	46,69	22,48	1.049,54
67	3.7.3.3	Concrete bed for drainage pipe, C 16/20 / Betonska podloga C ispod drenažne cijevi.	m3	9,59	270,51	2.594,19
	3.7.3.4	Supply and casting of drainage pipe made from PP, two layers with ribbed reinforcement and smooth inside surface in accordance with DIN 16961, pipe for loading class SN 8 in accordance with DIN EN ISO 9969 and DIN 4262-1, type R2, perforated 220 with construction of concrete outlets in the bed in accordance with design. / Polaganje drenažnih cijevi izrađenih od PP, dvoslojna sa rebrastim ojačanjima i glatkom unutarnjom površinom prema DIN 16961, cijevi klase nosivosti SN 8 prema DIN EN ISO 9969 i DIN 4262-1, tip R2, perforirana 220 step sa izradom bet. izlaznih glava na podlozi prema projektu.				
68		a) Pipes Ø20 cm perforated / Cijevi Ø20 cm perforirane	m1	159,89	27,34	4.370,87
	3.7.3.5	Backfill of drainage trenches / Ispuna drenažnih rovova				4.371,39
69		a) Filter material backfill as it is indicated in drawings. / Filterskim materijalom prema projektu.	m3	30,38	53,34	1.620,97



Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
	3.12	DRAINAGE CHANNEL ODVODNI JARKOVI				
70	3.12.3.1	Excavation of channel in material of III and IV category including hauling and transport to disposal area. / Iskop jaraka u materijalu III i IV kategorije uključujući utovar i transport na deponiju.	m3	24,49	26,67	653,15
	3.12.3.6	Supply and placing of concrete chanel C30/37 XC4, XD3, XF4 all necessary works and materials for completion are included, including sand bed d=8 cm. / Nabavka i ugradnja betonske segmentne kanalice C30/37 XC4, XD3, XF4. U cijenu ukljuceni svi potrebni radovi i materijali za kompletnu izradu, uključujući podlogu od pijeska d=8 cm				
71		a) precast or cast in situ segmental d=50cm / prefabrikovani ili izrađen na licu mjesta, segmentni d=50cm	m1	201,00	64,77	13018,77
	3.13	CONSTRUCTION OF SHOULDERS IZRADA BANKINA				
72	3.13.3.1	Made from sand, gravel and stone particles / Posute pijeskom, šljunkom, kamenom sitnježi.	m2	211,60	5,24	1.108,52 1.108,78
60-72		TOTAL ROAD BED UKUPNO DONJI STROJ:				121.993,32 121.988,99
4. PAVEMENT / GORNJI STROJ						
	4.3	SUB BASE DONJI NOSEĆI (TAMPONSKI) SLOJ				
	4.3.1	Construction of mechanically stabilized sub base (31 134) Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca debljine preko 40 cm				
73		-Outside of route. Limestone 0/45mm / Van trase Krečnjački materijal 0/45mm	m3	1.037,00	44,77	46.423,90 46.426,49
	4.5	ASPHALT PAVEMENT ASFALJNI KOLOVOZ				
	4.5.2	Construction of bearing course from bituminous material (31 342) Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22 ili 0/32 mm				
74		a) AGNS 22 + B 50/70 thickness 6 cm / AGNS 22 + B 50/70 u debljini 6 cm	m2	1.228,95	25,72	31.605,52 31.608,59




[Handwritten signature]




Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
	4.5.3	Construction of asphalt concrete from limestone material BB 11k (32 263) Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog betona BB 11k iz smjese frakcija karbonskog kamena i bitumena za ceste				
75		a) BB11k+B50/70 thickness 40 mm / BB 11k + B50/70 u debljini 40 mm	m2	1.228,95	23,53	28.913,20 28.917,19
76		b) BB11k+B50/70 thickness 40 mm / BB 11k + B50/70 u debljini 40 mm	m2	654,24	23,53	15.392,14 15.394,27
	4.7	Supply and placing of curbs. / Izrada ivičnjaka.				
		a) Concrete curbs C30/37, XF4/ Betonski ivičnjaci C 30/37, XF4:				
77		- dim. 18/24 cm	m1	423,00	44,58	18.856,07 18.857,34
78		- dim. 10/15 cm	m1	412,00	29,53	12.165,33 12.166,36
73-78		TOTAL PAVEMENT UKUPNO GORNJI STROJ				153.356,18 153.370,24

5. RETAINING WALL / POTPORNJI ZIDovi						
	8.4.5.2	EARTH WORKS/ ZEMLJANI RADOVI				
	1.1	Excavation of foundations outside of permanent water-course/ Iskop temelja van stalnih površinskih voda:				
79		a) Depth 0-2m in material of III and IV category/ dub. 0-2 m u mat. III i IV klg. =1,60*17,60	m3	28,16	22,48	633,01
	2.3	Backfilling of retaining wall foundations/ Zatrpavanje temelja potpornog zida				
80		a) With excavated material / Materijalom iz iskopa; =0,76*17,60	m3	13,38	6,70	89,68
		CONCRETE WORKS/ RADOVI OD BETONA				
		NON REINFORCED CONCRETE/ NEARMIRANI BETON				
81	8.1; 8.2; 8.3	Placement of lean concrete d=10cm, concrete class C 16/20/ Izrada podložnog sloja betona d=10 cm od betona C 16/20 =0,10*(17,60*1,1)	m3	1,94	276,23	535,88

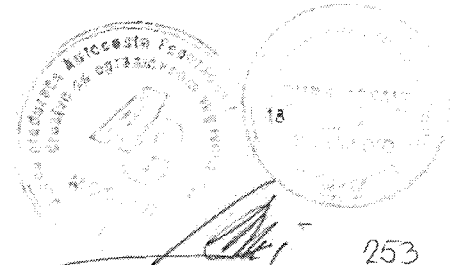

Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
		REINFORCED CONCRETE STRUCTURES/ ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE				
	8.1, 8.2, 8.3	Construction of foundations for retaining wall/ Betoniranje temelja potpornog zida				
82		a) C 25/30 XC2, XA1 =0,66*17,60	m3	11.62	333,38	3893,82 3.873,88
	8.1, 8.2, 8.3	Construction of concrete walls / Betoniranje zidova				
83		a) C30/37 XC4, XD1, XF2, =0,89*17,60	m3	15.68	485,18	7607,24 7.607,31
	8.4.5.6.	METAL WORKS RADOVI OD METALA				
	8.1, 8.2, 8.3	Supply, cutting, bending and placement of reinforcement/ Izrada i montaža armature				
84		a) Ø>12 Bst 500	kg	272.80	3,20	873,01 872,96
79-84		TOTAL RETAINING WALL UKUPNO POTPORNII ZID				13.612,69 13.612,72
11. VARIOUS WORKS / RAZNI RADOVI						
85		Construction of cross-drain gutters through sidewalk. All necessary works and materials for completion are included. Calculation per piece of built outlets. / Izrada poprečnog ispusta rigola kroz pješačku stazu. U cijenu ukljuceni svi potrebni radovi i materijali za kompletnu izradu pozicije. Obračun po komadu izvedenog ispusta.	pcs/ko m	4.00	523,88	2.095,50 2.095,52
85		TOTAL VARIOUS WORKS UKUPNO RAZNI RADOVI:				2.095,50 2.095,52



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Nr	Item/ Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
----	--------------	------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------------

	B 7.4.	LOCAL ROAD AT KM 1+121.08 LOKALNI PUT na km 1+121.08				PRICE CIJENA
58-59	2	PREPARATION WORKS PRIPREMNI RADOVI				3.872,87 3.873,08
60-72	3	ROAD BED DONJI STROJ				121.993,32 121.988,99
73-78	4	PAVEMENT GORNJI STROJ				153.356,16 153.390,24
79-84	5	RETAINING WALL POTPORNI ZIDOVI				13.612,69 13.612,72
85	11	VARIOUS WORKS RAZNI RADOVI:				2.095,50 2.095,52
		TOTAL LOCAL ROAD AT KM 1+121.08 UKUPNO LOKALNI PUT na km 1+121.08				294.930,53 294.949,55



Nr.	Item / Proz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
B.7.5. LOCAL ROAD from km 0+300.00 to km 0+687,50 LOKALNI PUT od km 0+300.00 do km 0+687,50						
3. ROAD BED / DONJI STROJ						
86	3.1	Bulk excavations of topsoil, included loading and hauling to the Disposal area Široki otkopi i prevozi humusa sa odvozom viška materijala na deponiju	m3	399.51	17,72	7.079,32
	3.2	Bulk excavations on route: Otkopavanje zemlje u širokom otkopu na trasi:				
87		a) In material of III and IV category, including loading and transport to disposal area. / U materijalu III i IV klg. sa utovarom i prevozom na deponiju.	m3	726,09	14,00	10.166,53
	3.2	Bulk excavation and delivery of V and VI category material from quarry. Transport to the site is included in price. Material suitable for work in winter and rainy conditions. The investor is not in charge for quarry. / Široki iskop i doprema materijala V i VI kategorije iz kamenoloma (pozajmišta). Cijena uključuje i prevoz na trasu. Materijal pogodan za rad u kišnim i zimskim uslovima. Kamenolom nije obaveza investitora.				
88		a) For embankment of road bed, item 3.4./ Za nasip trupa puta, stavka 3.4. d=0-300mm,	m3	174,80	23,94	4.184,71
89	3.3	Compaction of subsoil/ Nabijanje podtla	m2	1.730,94	0,48	824,56
	3.13	CONSTRUCTION OF SHOULDERS IZRADA BANKINA				
90	3.13.3.1	Stone particles, sand or gravel (d=5cm)/ Posute pijeskom, šljunkom, kamenom sitnježi. (d=5cm)	m2	387,34	5,24	2.029,66
86-90		TOTAL ROAD BED UKUPNO DONJI STROJ				24.282,26
4. PAVEMENT/ GORNJI STROJ						
	4.3	SUB BASE DONJI NOSEĆI (TAMPONSKI) SLOJ				
	4.3.1	Construction of mechanically stabilized sub base. / Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tampona)				
91		- Limestone 0/45mm. Thickness: d=30 cm / Krečnjački materijal 0/45mm. Debljine: d=30cm	m3	475,81	44,67	21.256,43
	4.9	MACADAM PAVEMENT MAKADAMSKI KOLOVOZ				



[Handwritten signature]



256


Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
92		Construction of base course (macadam), limestone 0/25mm, thickness 5 cm / Izrada gornjih nosećih sloja (makadam), krečnjački materijal 0/25mm, debljine 5 cm	m2	1.162,02	9,05	10.514,83 10.516,28
91-92		TOTAL PAVEMENT GORNJI STROJ: UKUPNO				31.770,93 31.770,71
	B 7 5	SUMMARY REKAPITULACIJA				PRICE CIJENA
86-90	3	ROAD BED DONJI STROJ				24.282,26 24.282,80
91-92	4	PAVEMENT GORNJI STROJ				31.770,93 31.770,71
		TOTAL LOCAL ROAD FROM km 0+300.00 TO km 0+833.50 UKUPNO LOKALNI PUT od km 0+300.00 do km 0+833.50				56.053,19 56.060,52

Nr	Item/ Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM	
B. 7.6 LOCAL ROAD from km 1+100 to km 1+180 / LOKALNA CESTA od km 1+100 do km 1+180							
2. PREPARATION WORKS / PRIPREMNI RADOVI							
93	2.4	Removing of trees and bushes/ Odstranjivanje grmlja i drveća	km	0,12	8.572,50	1.028,70	
93		TOTAL PREPARATION WORKS PRIPREMNI RADOVI	UKUPNO			1.028,70	
3. ROAD BED / DONJI STROJ							
94	3.1	Bulk excavations of topsoil, included loading and hauling to the disposal area Široki otkopi i prevozi humusa sa odvozom viška materijala na deponiju	m3	175,00	17,72	3.100,39	3.101,00
	3.2	Bulk excavations on route./ Otkopavanje zemlje u širokom otkopu na trasi.					
95		a) In material of III and IV category, including loading and transport to disposal area. / U materijalu III i IV klg. sa utovarom i prevozom na deponiju.	m3	1.931,50	15,07	29.102,88	29.107,71
96	3.3	Compaction of subsoil Nabijanje podtla	m2	542,20	0,51	277,88	276,52
	3.11	Vegetative slope protection Vegetativna zaštita kosina					
97	3.11.1	Grassing o slopes Zatravlivanje kosina	m2	217,50	4,61	1.003,22	1.002,68
	3.13	CONSTRUCTION OF SHOULDERS IZRADA BANKINA					
98	3.13.3.1	Made from sand, gravel and stone particles / Posute pijeskom, šljunkom. kamenom sitnježi.	m2	139,00	5,64	783,61	783,96
94-98		TOTAL ROAD BED UKUPNO DONJI STROJ:				34.267,97	34.271,80
4. PAVEMENT / GORNJI STROJ							
	4.3	SUB BASE DONJI NOSEĆI (TAMPONSKI) SLOJ					
	4.3.1	Construction of mechanically stabilized sub base (31 134) Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomerne granulacije drobljenca debljine preko 40 cm					


Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
99		-Outside of route. Limestone 0/45mm / Van trase Krečnjački materijal 0/45mm	m3	168,00	44,89	7.540,68 7.541,52
	4.5	ASPHALT PAVEMENT ASFALJNI KOLOVOZ				
	4.5.2	Construction of bearing course from bituminous material (31 393) Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm				
100		a) ANHS 16 + B 50/70 thickness 6 cm/ ANHS 16 + B 50/70 u debljini 6 cm	m2	442,00	29,05	12.840,65 12.840,10
	4.7	Supply and placing of curbs. / Izrada ivičnjaka.				
		a) Concrete curbs C30/37, XF4/ Betonski ivičnjaci C 30/37, XF4				
101		- dim. 18/24 cm	m1	118,00	44,58	5.260,09 5.260,44
		a) Construction of asphalt gutter according to design. Curb not included in unit rate, d=6 cm/ Izrada rigola od asfalta prema projektu. Ivičnjak nije uključen u cijenu, d= 6 cm				
102		a) Width/ šir. 50 cm	m1	118,00	64,17	7.642,86
99-102		TOTAL PAVEMENT UKUPNO GORNJI STROJ:				33.284,28 33.284,52

5. RETAINING WALL / POTPORNJI ZIDOVİ

8 4 5.2. EARTH WORKS/ ZEMLJANI RADOVI						
	1.1	Excavation of foundations outside of permanent water-course/ Iskop temelja van stalnih površinskih voda:				
103		a) Depth 0-2m in material of III and IV category/ dub. 0-2 m u mat. III i IV klg. =1,60*17,60	m ³	28,16	22,48	633,01 633,04
	2.3	Izrada drenaže iza leđa zida				
104		a) U cijenu stavke uključiti: filterski materijal sastavljen iz frakcija 16/32 mm, sa drenažnom cijevi (PHD perforirana) DN 150mm, na dnu u betonskoj tajači,	m ¹	65,00	61,91	4.024,31 4.024,15
	2.3	Backfilling of retaining wall foundations/ Zatrpavanje temelja potpornog zida				
105		a) With excavated material / Materijalom iz iskopa: =0,76*17,60	m ³	13,38	6,67	89,21 89,24
103-105		TOTAL EARTH WORKS/ UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				4.746,53 4.746,43




[Handwritten Signature]



Nr.	Item/ Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
-----	--------------	------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------------

		CONCRETE WORKS/ RADOVI OD BETONA				
		NON REINFORCED CONCRETE/ NEARMIRANI BETON				
106	8.1; 8.2; 8.3	Placement of lean concrete d=10cm, concrete class C 16/20 / Izrada podloznog sloja betona d=10 cm od betona C 16/20 =0,10*(17,60*1,1)	m3	1,94	276,23	535,88
		REINFORCED CONCRETE STRUCTURES/ ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE				
107	8.1; 8.2; 8.3	Construction of foundations for retaining wall/ Betoniranje temelja potpornog zida a) C25/30 XC1, XA1,; =0,66*17,60	m3	11,62	333,38	3.873,88
108	8.1; 8.2; 8.3	Construction of concrete walls / Betoniranje zidova : a) C 30/37 XC4, XD1, XF2; =0,89*17,60	m3	15,66	485,18	7.607,31
106-108		TOTAL CONCRETE WORKS/ UKUPNO RADOVI OD BETONA:				12.016,93

	8.4.5.6.	METAL WORKS RADOVI OD METALA				
		METAL WORKS/ RADOVI OD METALA				
109	8.1; 8.2; 8.3	Supply, cutting, bending and placement of reinforcement/ Izrada i montaža armature: a) Ø>12 Bst 400/500	kg	272,80	3,28	893,69
109		TOTAL METAL WORKS UKUPNO RADOVI OD METALA:				893,69



Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
-----	------------	------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------------

11. VARIOUS WORKS / RAZNI RADOVI

110		Construction of cross-drain gutters through sidewalk. All necessary works and materials for completion are included. Calculation per piece of built outlets. / Izrada poprečnog ispusta ngola kroz pješačku stazu. U cijenu uključeni svi potrebni radovi i materijali za kompletnu izradu pozicije. Obračun po komadu izvedenog ispusta.	pcs/ko m	4,00	523,88	2.095,50 2.055,52
-----	--	---	-------------	------	--------	------------------------------

110		TOTAL VARIOUS WORKS UKUPNO RAZNI RADOVI:				2.095,50 2.055,52
-----	--	---	--	--	--	------------------------------

	B.7.6	LOCAL ROAD from km 1+100 to km 1+180 LOKALNI PUT od km 1+100 do km 1+180			PRICE CIJENA
93	2	PREPARATION WORKS PRIPREMNI RADOVI			1.028,70
94-98	3	ROAD BED DONJI STROJ			34.287,97 34.271,86
99-102	4	PAVEMENT GORNJI STROJ			33.284,28 33.284,28
109	5	RETAINING WALL POTPORNI ZIDOVI			17.657,16 17.658,29
110	11	VARIOUS WORKS RAZNI RADOVI:			2.095,50 2.055,52
		TOTAL LOCAL ROAD from km 1+100 to km 1+180 UKUPNO LOKALNI PUT od km 1+100 do km 1+180			88.333,61 88.339,29


B.7.7. ACCESS ROAD on km 1+460
PRISTUPNI PUT na km 1+460

2. PREPARATION WORKS / PRIPREMNI RADOVI


111	2.4.	Odstranjivanje grmlja i drveća	km	0,18	8.577,50	1.371,60
111		UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				1.371,60

3. ROAD BED / DONJI STROJ

112	3.1	Bulk excavations of topsoil, included loading and hauling to the disposal area. / Široki otkopi i prevozi humusa sa odvozom viška materijala na deponiju	m3	133,21	17,72	2.360,01 2.360,48
	3.2	Bulk excavations on route. / Otkopavanje zemlje u širokom otkopu na trasi.				
113		a) In material of III and IV category, including loading and transport to disposal area. / U materijalu III i IV klg. sa utovarom i prevozom na deponiju.	m3	92,05	14,00	1.288,86 1.288,70




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM	
114	3.3	Compaction of subsoil Nabijanje podtla	m2	626,78	9,48	298,50	300,85
	3.13	CONSTRUCTION OF SHOULDERS IZRADA BANKINA					
115	3.13.3.1	Made from sand, gravel and stone particles / Posute pijeskom, šljunkom, kamenom sitnježi.	m2	155,36	5,24	813,89	814,09
112-115		TOTAL ROAD BED UKUPNO DONJI STROJ:				4.761,27	4.764,12

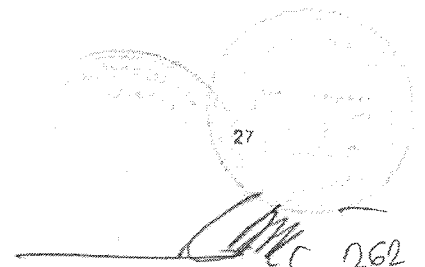Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
4. PAVEMENT / GORNJI STROJ						
	4.3	SUB BASE DONJI NOSEĆI (TAMPONSKI) SLOJ				
	4.3.1	Construction of mechanically stabilized sub base (31 133) Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca debljine 31 do 40 cm				
116		-Outside of route. Limestone 0/45mm / Van trase. Krečnjački materijal 0/45mm	m3	199,17	48,18	9.595,01
	4.5	ASPHALT PAVEMENT ASFALNI KOLOVOZ				
	4.5.2	Construction of bearing course from bituminous material (31 344) Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22 ili 0/32 mm				
117		a) AGNS 22 + B 50/70 thickness 8 cm/ AGNS 22 + B 50/70 u debljini 8 cm	m2	825,38	36,39	30.032,79
	4.5.3	Construction of asphalt concrete from limestone material BB 11k (32 263) Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog betona BB 11k iz smjese frakcija karbonskog kamena i bitumena za ceste				
118		a) BB11k+B50/70 thickness 40 mm / BB 11k + B50/70 u debljini 40 mm	m2	788,39	25,32	19.960,06
116-118		TOTAL PAVEMENT UKUPNO GORNJI STROJ:				59.587,87
	B.7.7.	ACCESS ROAD on km 1+460 PRISTUPNI PUT NA KM 1+460				
111	2	PREPARATION WORKS PRIPREMNI RADOVI				1.371,60
112-115	3	ROAD BED DONJI STROJ				4.761,27
116-118	4	PAVEMENT GORNJI STROJ				59.587,87
		TOTAL ACCESS ROAD on km 1+460 UKUPNO PRISTUPNI PUT na km 1+460				65.720,74
	B.7	SUMMARY ROADS OUT OF ALIGNMENT REKAPITULACIJA PUTEVI VAN TRASE				
	B.7.4	LOCAL ROAD AT KM 1+121.08 LOKALNI PUT na KM 1+121.08				294.930,53
	B.7.5	LOCAL ROAD from 0+300.00 to km 0+687,50 LOKALNI PUT od km 0+300.00 do km 0+687.50				56.060,52
	B.7.6	LOCAL ROAD from km 1+100 to km 1+180 LOKALNI PUT 1 od km 1+100 do km 1+180				88.333,61
	B.7.7.	ACCESS ROAD on km 1+460 PRISTUPNI PUT na km 1+460				65.720,74
		TOTAL ROADS OUT OF ALIGNMENT UKUPNO SAOBRAĆAJNICE VAN TRASE				505.038,40

5.596,01

30.034,85

19.962,03

59.592,89

4.764,12

59.592,89

65.728,61

294.940,55

56.060,52


88.333,29

65.728,61

505.068,98

263


Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
6. FINISHING WORKS / ZAVRŠNI RADOVI						
167	Anex 1.3.2.7.1	Cleaning of the area of works after completion of works (normally: three times the width of the trench). / Čišćenje zone radova nakon završetka radova. (Uzima se trostruka širina rova). Obračun po m ²	m ²	6.012,60	0,35	2.104,41
167		TOTAL FINISHING WORKS / UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:				2.104,41
7. VARIOUS WORKS / RAZNI RADOVI						
168	Anex 1.3.2.8.1	Testing the system for leakage before the backfilling. / Ispitivanje kanalizacije na vodopropusnost prije zatrpavanja rova.	m ¹	1.788,00	2,78	4970,64
169	Anex 1.3.2.8.2	CCTV insepction of pipelline after completion of works, all in accordance with the EN 13508-2. / CCTV inspekcija (video kontrola) cjevovoda po završetku radova, u svemu prema EN 13508 - 2.	m ¹	1.600,00	2,55	4080,00
170	Anex 1.3.2.8.3	Linning of chanel with stone material on the concrete bed. All necessary works and materials for completion are included. / Oblaganje jaraka kamenom na podlozi od betona MB20. U cijenu uključeni svi potrebni radovi i materijali za kompletnu izradu.	m ²	20,00	50,00	1000,00
168-170		TOTAL VARIOUS WORKS / UKUPNO RAZNI RADOVI:				10.050,00 10.059,64
B 2 SUMMARY DRAINAGE OF ROAD UKUPNO ODVODNJA PUTA						
119-122	1	PRELIMINARY WORKS PRIPREMNI RADOVI				1.050,00
123-131	2	EARTH WORKS ZEMLJANI RADOVI				146.023,00
132	3	CARPENTRY WORKS TESARSKI RADOVI				2.467,44
133-138	4	CONCRETE WORKS BETONSKI RADOVI				24.775,35
139-166	5	ASSEMBLY WORKS MONTAŽNI RADOVI				682.999,55
167	6	FINISHING WORKS ZAVRŠNI RADOVI				2.104,41
168-170	7	VARIOUS WORKS RAZNI RADOVI				10.050,64
	1-7	TOTAL DRAINAGE UKUPNO ODVODNJA				869.470,41




Nr.	Item/ Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
8.1; 8.2; RETAINING WALL FROM KM 1+164.06 TO KM 1+180.17						
8.3 POTPORNİ ZID OD KM 1+164.06 DO KM 1+180.17						
EARTH WORKS/ ZEMLJANI RADOVI						
	8.1; 8.2; 8.3	Excavation of foundations outside of permanent water-course including loading and transport to disposal area./ Iskop temelja van stalnih površinskih voda sa utovarom i transportom materijala na deponiju.				
364		a) Depth 0-2m in material of III and IV category/ dub 0-2 m u mat. III i IV klg. =4.50*18 30*2.0	m ³	164.70	28,88	4.755,71
	8.1; 8.2; 8.3	Backfilling of retaining wall foundations/ Zatrpavanje temelja potpornog zida				
365		a) With excavated material / Materijalom iz iskopa; =164.70-41.25	m ³	123.45	8,53	1.052,41
364-365		TOTAL EARTH WORKS/ UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				5.808,12
CONCRETE WORKS/ RADOVI OD BETONA						
	8.1; 8.2; 8.3	NON REINFORCED CONCRETE/ NEARMIRANI BETON				
366		Placement of lean concrete d=10cm, concrete class C 16/20/ Izrada podložnog sloja betona d=10 cm od betona C 16/20 =0,10*2.60*13.50	m ³	3,51	297,25	1.043,35
		REINFORCED CONCRETE STRUCTURES/ ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE				
	8.1; 8.2; 8.3	Construction of foundations for retaining wall/ Betoniranje temelja potpornog zida				
367		a) C 25/30 XC2,XA1 ; =2.50*16.50*1.0	m ³	41,25	481,25	19.851,56
	8.1; 8.2; 8.3	Construction of concrete walls / Betoniranje zidova :				
368		a) C 30/37 XC4,XD1,XF2 ; =1.85*16.30*0.50	m ³	15,08	701,25	10.574,85
369		Construction of cornices and footway C 30/37 XC4,XD1,XF2 on top of retaining wall. All visible surfaces should be built in new formwork. / Izrada rubnog vijenca pješačke staze C 30/37 XC4,XD1,XF2 po gornjem rubu potpornog zida. Sve vidljive površine izvesti u novoj oplati ; =0.42*16.30	m ³	6.85	1.485,00	10.172,25
366-369		TOTAL CONCRETE WORKS/ UKUPNO RADOVI OD BETONA:				41.642,01
	8.1; 8.2; 8.3	METAL WORKS/ RADOVI OD METALA				
		Supply, cutting, bending and placement of reinforcement/ Nabavka i montaža armature				
370		a) Ø > 12 Bst 500 s	kg	7.886.20	4,13	32.570,01

Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
		Supply and assembling of steel rail on the footway as it is indicated in design / Nabavka i ugradnja čelične ograde na pješačkoj stazi prema projektu:				
371		c) Pedestrian fence from steel tubes or profiles / Pješačka ograda od čeličnih cijevi ili profila =34.80*16.30	kg	567.24	13,75	7.799,55
372		b) Continuous stretch of safety barrier / Kontinuirani potezi zaštitne ograde (JCSO ras. st. 2.50m) =16.30	m	16,30	269,50	4.343,95
370-372		TOTAL METAL WORKS/ UKUPNO RADOVI OD METALA:				44.674,05

44.713,51



[Handwritten signature]

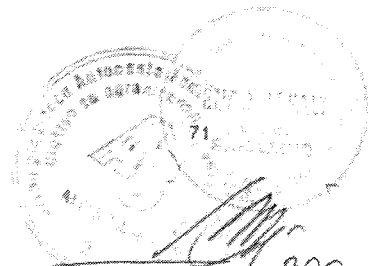


306

Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
		SUMMARY RETAINING WALL REKAPITULACIJA POTPORNI ZID				PRICE CIJENA
364-365		EARTH WORKS ZEMLJANI RADOVI			5.808,12	5.809,50
366-369		CONCRETE WORKS BETONSKI RADOVI			41.642,01	
370-372		METALWORKS RADOVI OD METALA			44.674,08	44.713,51
		TOTAL RETAINING WALL UKUPNO POTPORNI ZID			92.124,21	92.165,08
		SUMMARY ALIGNMENT AND RETAINING WALL REKAPITULACIJA TRASA PUTA I POTPORNI ZID				PRICE CIJENA
	B.1	SUMMARY ALIGNMENT REKAPITULACIJA TRASA PUTA			142.338,11	
		SUMMARY RETAINING WALL REKAPITULACIJA POTPORNI ZID			92.124,21	92.165,08
		TOTAL ALIGNMENT AND RETAINING WALL UKUPNO TRASA PUTA I POTPORNI ZID			234.462,32	234.503,19



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
	C	BREAKDOWN OF STRUCTURES REKAPITULACIJA OBJEKATA				PRICE CIJENA
	C.1	TOTAL VIADUCT ROGAČICI 1 UKUPNO VIJADUKT ROGAČICI 1				2.189.697,94
	B.1	TOTAL ALIGNMENT AND RETAINING WALL UKUPNO TRASA PUTA I POTPORNI ZID				
	C.2	TOTAL VIADUCT ROGAČICI 2 UKUPNO VIJADUKT ROGAČICI 2		234.503,19		234.462,32
	B.5	TOTAL MINOR STRUCTURES UKUPNO MANJI OBJEKTI				2.054.832,38
		TOTAL STRUCTURES UKUPNO OBJEKTI				269.930,67
						4.748.923,18

4.748.964,15




Nr.	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit JAM	Quantity Količina	Unit price JAC KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
647	19	Zaštitna cijev za zaštitu kabela uz stub (dužine L=2,5-3 m)	kom	8,00	42,00	336,00
648	20	PVC cijev, rebrasta promjera $\Phi 160$, dužine L=6m, sa krajevima za spajanje i nastavljivanje	kom	42,00	14,86	623,70
649	21	Betonski stubići za obilježavanje podzemne trase kabela 0,4 kV	kom	6,00	21,00	126,00
650	22	Sitnozrnasti pijesak - za kablovski kanal	m ³	9,50	31,75	301,63
629-650		UKUPNO Oprema za podzemni dio				10.807,67


2.		Oprema za nadzemni dio				
651	1	Armirano betonski stub 10/650 daN	kom	3,00	745,00	2.235,00
652	2	Armirano betonski stub 10/1000 daN	kom	1,00	1.075,00	1.075,00
653	3	Armirano betonski stub 10/1600 daN	kom	3,00	1.075,00	3.225,00
654	4	Obujmica dvodijelna 210-240 mm	kom	5,00	22,00	110,00
655	5	Obujmica dvodijelna 170-210 mm	kom	4,00	19,00	76,00
656	6	Betonska cijev, promjera 600mm i dužine l=1m	kom	8,00	128,00	768,00
657	7	Betonska cijev, promjera 500mm i dužine l=1m	kom	8,00	107,65	861,20
658	8	Konzola za betonski stub S-10	kom	18,00	153,75	2.767,50
659	9	Stezaljka zatezna za SKS - S-22	kom	16,00	12,80	204,80
660	10	Stezaljka zatezna za SKS 2(4x16 mm ²)	kom	11,00	6,65	73,15
661	11	Remen plastificirani Lx220, tip RP-220x20	kom	30,00	3,30	99,00
662	12	Štopica kompresiona A/ 70/12	kom	10,00	2,95	29,50
663	13	SKS presjeka 3x70+71,5 mm ²	m	190,00	9,75	1.852,50
664	14	SKS presjeka 3x35+71,5 mm ²	m	50,00	9,75	487,50
665	15	SKS presjeka 2x16 mm ² za kućni priključak	m	70,00	1,95	136,50
666	16	SKS presjeka 4x16 mm ² za kućni priključak	m	80,00	2,85	228,00
667	17	Izolovana čaura za kućni priključak METALIS 16-16 mm ²	kom	12,00	3,30	39,60
668	18	Katodni odvodnik prenapona - 0,4kV, 10 kA (3 kom)	set	1,00	25,05	25,05
669	19	Kompresiona olojerna stezaljka 70/70 mm ² (KOS 70/70)	kom	21,00	6,95	145,95
670	20	Kompresiona olojerna stezaljka 70/35 mm ² (KOS 70/35)	kom	3,00	6,10	18,30
671	21	Toplosakupljača krpa - Rajhem	kom	24,00	9,75	234,00
672	22	IOS 1-2 Izolirana vječana strujna stezaljka 1/2 priključka MP10-35	kom	17,00	9,20	156,40
673	23	Izolirana vječana strujna stezaljka 1/2 priključka MP10-35	kom	28,00	12,20	341,60
674	24	Vruće pocinčani traka za uzemljenje 25x4 mm ²	kg	100,00	1,70	170,00
675	25	Vijak M 12x35 sa maticom i podloškom	kom	8,00	2,55	20,40
676	26	Sitnozrnasti pijesak - za temelje	m ³	2,10	31,75	66,68
677	27	Beton C 18/20 za temelje	m ³	9,72	106,00	1.030,80
651-677		UKUPNO Oprema za nadzemni dio				17.741,03

3.		Građevinski i elektromontažni radovi-podzemni dio				
678	1	Iskočavanje trase NN kabela	km (trase)	0,17	2.100,00	357,00
679	2	Iskop i zatrpavanje rova (ručno ili mašinski) prosječne dubine 80 cm i širine 40 cm izatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje istog u slojevima i odvozom viška materijala na deponiju	m	90,00	8,50	765,00



Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
	4	Građevinski i elektromontažni radovi-nadzemni dio				
695	1	Iskoičavanje trase NNM prema tehničkoj specifikaciji	km	0,18	2.100,00	378,00
696	2	Izrada temelja za armirano-betonski stub, tip temelja P100 (mašinski ili ručni iskop temeljne jame - sve kategorije tla; nabavka, transport i ugradnja pijeska u cijevi oko stuba=0,3 m3; nabavka, transport i ugradnja betona MB20 = 1,84 m3; izrada završne kape iznad temelja stuba betonom, razastiranje ili odvoz viška materijala iz iskopa)	kom	3,00	455,00	1.365,00
697	3	Izrada temelja za armirano-betonski stub, tip temelja P80 (mašinski ili ručni iskop temeljne jame - sve kategorije tla; nabavka, transport i ugradnja pijeska u cijevi oko stuba=0,3 m3; nabavka, transport i ugradnja betona MB20 = 1,05 m3; izrada završne kape iznad temelja stuba betonom; razastiranje i odvoz viška materijala iz iskopa)	kom	4,00	290,00	1.160,00
698	4	Transport po trasi i ugradnja armirano-betonskih stubova tipa 10/850 daN	kom	3,00	160,00	480,00
699	5	Transport po trasi i ugradnja armirano-betonskih stubova tipa 10/1000 daN	kom	1,00	160,00	160,00
700	6	Transport po trasi i ugradnja armirano-betonskih stubova tipa 10/1600 daN	kom	3,00	160,00	480,00
701	7	Ugradnja SKS presjeka 3x70 + 71,5 mm2 (sa zatezanjem, fiksiranjem i spajanjem)	m	180,00	1,05	189,00
702	8	Ugradnja SKS presjeka 3x35 + 71,5 mm2 (sa zatezanjem, fiksiranjem i spajanjem)	m	50,00	1,55	77,50
703	9	Izvođenje zateznog ovješnja prema tehničkoj specifikaciji za SKS (po stubnom mjestu)	kom	16,00	76,80	1.228,80
704	10	Ugradnja i spajanje odvodnika prenapona 0,4 kV, prema tehničkoj specifikaciji i spajane istih sa SKS -om odgovarajućom spojnom opremom	set	8,00	125,00	1.000,00
705	11	Izvedba kućnog priključka (monofazni i trofazni) sa razvlačenjem zatezanjem i spajanjem sa postojećom NNM i kućnom instalacijom	kom	7,00	97,50	682,50
706	12	Geodetsko snimanje trase	km	0,18	2.100,00	378,00
707	13	Izrada izvedbene dokumentacije	kom	1,50	1.500,00	1.500,00
693-707		UKUPNO Građevinski i elektromontažni radovi-nadzemni dio				9.172,40
		Napomena:				
		Izvođač je dužan da preda Investitoru kompletan demontirani materijal.				


REKAPITULACIJA KOLIZIJA NNM 2				UKUPNO
629-650	1	Oprema za podzemni dio		10.807,67
651-677	2	Oprema za nadzemni dio		18.041,03
678-694	3	Građevinski i elektromontažni radovi-podzemni dio		8.309,43
695-707	4	Građevinski i elektromontažni radovi-nadzemni dio		9.172,40
		UKUPNO REKAPITULACIJA KOLIZIJA NNM 2		46.120,52



Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit j/m	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
858	13	Raznošenje duž trase i postavljanje betonskih stubića za uređen teren za označavanje trase kabla. Pozicija obuhvata preuzimanje u skladištu, transport i ugradnju betonskih stubića za oznaku trase kabla za uređen teren.	kom	5,00	5,15	25,75
859	14	Montaža kablovske završnice/adaptora prema tehničkoj specifikaciji	set	4,00	46,15	184,60
860	15	Montaža kablovske spojnice prema tehničkoj specifikaciji	set	2,00	25,60	51,20
861	16	Montaža SN SF-6 bloka (3+1) u transformatorskoj stanici	kom	1,00	1.845,00	1.845,00
862	17	Ispitivanje, pregled i odzivanje aletne dokumentacije prema tehničkoj specifikaciji	kom	1,00	1.385,00	1.385,00
863	18	Demontaža nadzemnog 10 kV dalekovoda (11 drvenih stubova sa pripadajućom opremom)	m	0,35	6.850,00	2.397,50
864	191	Geodetsko snimanje trase	m	0,22	2.100,00	462,00
865	20	Izrada izvedene dokumentacije	kom	1,00	1.590,00	1.590,00
866	21	Polaganje dvodjelnih armirano-betonskih kanala dimenzija 32x16 cm dužine 1m (unutrašnji promjer kanala je 22 cm) za zaštitu kabla ispod Autoputa	kom	336,00	10,10	3.393,60
846-868		UKUPNO Građevinski i elektromontažni radovi-podzemni dio				16.908,90

REKAPITULACIJA SN KOLIZIJA BR. 3			UKUPNO
827-845	1	Oprema za podzemni dio	
846-866	2	Građevinski i elektromontažni radovi-podzemni dio	66.290,80
		UKUPNO REKAPITULACIJA SN KOLIZIJA BR. 3	16.908,90
			83.199,70

REKAPITULACIJA - IZMJEŠTANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA		UKUPNO
	KOLIZIJA NNM 1	
	KOLIZIJA NNM 2	10.001,07
	KOLIZIJA NNM 3	46.420,52
	SN KOLIZIJA 1	12.924,40
	SN KOLIZIJA 2	163.295,91
	SN KOLIZIJA 3	70.673,42
	UKUPNO IZMJEŠTANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA	83.199,70
		386.515,02 386.215,02



125

Nr	Item / Poz	DESCRIPTION OF WORKS VRSTA RADA	Unit J/M	Quantity Količina	Unit price J/C KM	TOTAL PRICE UKUPNO KM
----	---------------	------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------------

REKAPITULACIJA - IZMJEŠTANJE GASOVODA						UKUPNO
927-930		PRETHODNI RADOVI				4.389,00
931-939		ZEMLJANI RADOVI				3.833,10
940-957		MONTAŽNI RADOVI				30.974,00
958-960		ZAVRŠNI RADOVI				1.170,00
UKUPNO REKAPITULACIJA - IZMJEŠTANJE GASOVODA						40.357,10


G - REKAPITULACIJA - IZMJEŠTANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						UKUPNO
G1		IZMJEŠTANJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA				386.515,02 386.215,02
G2		IZMJEŠTANJE VODOVODA I KANALIZACIONE MREŽE				168.846,23
G3		IZMJEŠTANJE GASOVODA				40.357,10
G		UKUPNO IZMJEŠTANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				595.718,35 595.418,35



REKAPITULACIJA (KM)		
Sarajevska obilaznica LOT 3B		
Dionica: Vlakovo - Mostarsko Raskršće		
A	TRASA	5.517.455,21
B	PUTEVI VAN TRASE	505.068,98
D	ODVODNJA	869.470,41
E	SIGNALIZACIJA I OPREMA	479.328,30
F	OBJEKTI	4.748.923,28
G	INSTALACIJE - RASVJETA	335.970,40
G	INSTALACIJE - IZMJEŠTANJE	595.418,35
H	ZAŠTITA OD BUKE	3.791.026,43
K	OSTALI RADOVI	205.000,00
I	UKUPNO Σ (A;K)	17.047.702,23
II	NEPREDVIĐENI RADOVI 0,10 x I	1.704.770,22
III	CIJENA PONUDE bez PDV i POPUSTA (I +II)	18.752.472,46
IV	POPUST na stavku III [%]	375.054,47
V	UKUPNO SA POPUSTOM bez PDV Σ (III - IV)	18.377.423,01



Comic





EURO-ASFALT

EURO-ASFALT d.o.o. / Rajlovac bb / 71000 Sarajevo, BiH / T: +387 33 568 320 / F: +387 33 590 746 / info@euro-asfalt.ba / www.euro-asfalt.ba

JP „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar


Adema Buća 20

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

15.05.2019.

EA-IS-44/19



Predmet: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3b)“

SAGLASNOST ZA ISPRAVKU RAČUNSKE GREŠKE :

U svrhu odgovora na Vaš zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi, Broj: 01-01.3-2598-57/18 AK od 13.05.2019. godine, zaprimljen putem maila 14.05.2019. godine, a vezano za pregled naše ponude broj: EA – 04/19 za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3b)“, ovim putem izjavljujemo da smo saglasni sa uočenim i navedenim ispravkama računskih grešaka, prihvatamo ih i odobravamo te smo također saglasni sa navodom Komisije da ukupna cijena naše ponude iznosi: **18.377.423,01 KM** bez uključenog PDV-a, odnosno **21.501.584,92 KM** sa uključenim PDV-om (slovima: dvadesetjedanmilijonpetstotinajednahiljadpetstotinaosamdesetčetiri i 92/100 KM).

Za Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo:



Hamed Ramić

Direktor Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo




ISO 9001:2008
Br. cert.: 421360 QM08
ISO 14001:2004 cor.2009
Br. cert.: 421360 UM



ISO 9001:2008
Br. cert.: 421360 QM08
ISO 14001:2004 cor.2009
Br. cert.: 421360 UM



ISO 9001:2008
Br. cert.: 421360 QM08
ISO 14001:2004 cor.2009
Br. cert.: 421360 UM



ISO 9001:2008
Br. cert.: 421360 QM08
ISO 14001:2004 cor.2009
Br. cert.: 421360 UM



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
Public Company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. Mostar

Sjedište u Mostaru: Ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar, Tel.: +387 36 512 300, Fax: +387 36 512 301
Ured u Sarajevu: Ul. Hamdije Kreševljekov ča 19, 71000 Sarajevo, Tel.: +387 33 277 900, Fax: +387 33 277 901

e-mail: info@jpaautoceste.ba
www.jpautoceste.ba

Broj: 01-01.3-2598-57/18 AK
Datum: 13.05.2019.godine

Za: **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo**
Rajlovac bb
71000 Sarajevo
Fax: +387 33 590 746
e-mail: info@euro-asfalt.ba

PREDMET: Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi


Poštovani,

Prilikom provjere računске ispravnosti vaše ponude, broj: EA-04/19 od 16.04.2019. godine za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3b)“ uočili smo brojne računске greške u Predmjeru radova, te konsekvntno i u Obrascu za cijenu ponude i Obrascu za ponudu.

Shodno članu 17. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br.: 90/14 i 20/15), izvršili smo ispravku računskih grešaka, te vam u prilogu dostavljamo kopije stranica ponude sa izvršenim ispravkama cijene.

Molimo da i sami izvršite računsku provjeru ispravljenih iznosa, te da u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda date saglasnost na izvršene ispravke, odnosno saglasnost da ukupna cijena vaše ponude iznosi **18.377.423,01 KM** bez uključenog PDV-a, odnosno **21.501.584,92 KM** sa uključenim PDV-om (slovima: dvadesetjedanmilijonpetstotinajednahiljadpetstotinaosamdesetčetiri i 92/100 KM).

Traženu saglasnost potrebno je dostaviti najkasnije do 16.05.2019. godine do 15:00 sati na faks broj +387 33 277 942.



Prilog: - kao u tekstu.



Identifikacijski broj: 4227891540005 POJ broj: 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020310000214038
Transakcijski račun: Raiffeisen bank d.d Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610230062470038
Federalna faksa za korišćenje autoceste: 1610230062470232 i 338690229556422
Naknada za korišćenje cestovnog zemljišta: 1610230062470135 i 3386902295564549
Registrowana u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

Handwritten mark
